


# 苗栗縣南庄鄉公所 公告

發文日期：中華民國111年11月3日  
發文字號：南鄉農觀字第1110012252號  
附件：

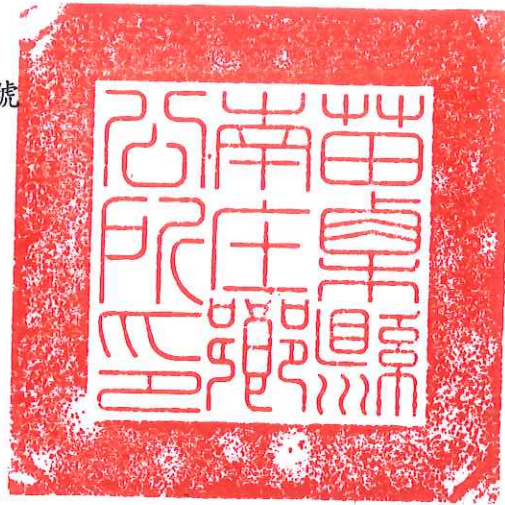

主旨：公告有關本鄉「108年亮點景區觀光環境整備計畫」-「南庄鄉國際慢城入口意象」工程案。

依據：苗栗縣南庄鄉民代表會第21屆第8次定期會會議總質詢辦理公告。

公告事項：有關本鄉辦理「108年亮點景區觀光環境整備計畫」-「南庄鄉國際慢城入口意象工程」，於108年7月25日南鄉代(21)會字第1080000642號函同意墊付在案。

鄉長 羅春蓮

苗栗縣南庄鄉民代表會第21屆第3次臨時會議決案送請執行單

受文者	苗栗縣南庄鄉公所	發 文	附 件	議 決 案 3 份 ( 甲 案 4 號 )
副 本			年 月 日	中 華 民 國 108 年 7 月 25 日
受文者			字 號	南 鄉 代 (21) 會 字 第 1080000642 號
提案人	鄉長 邱梓增			
案 由	敬請貴會准予先行墊付本所辦理108年度「亮點景區觀光環境整備計畫」-「南庄鄉國際慢城入口意象工程」，合計新台幣7,000,000元整，本案交通部觀光局補助5,040,000元，本所配合款1,960,000元。			
大 會 議 決	照案通過			
請 辦 理 事 項	檢送前項議決案3份，請查照。			

主席 黃順源



苗栗縣南庄鄉公所辦理交通部觀光局「108年度亮點景區觀光環境整備計畫」-「南庄鄉國際慢城入口意象工程」

大事記

- 108.03.05 南庄鄉公所：提報「南庄鄉國際慢城入口意象工程」提案計畫書
- 108.03.08 本府彙整各提案公所計畫書件至交通部觀光局共計5件
- 108.04.25 交通部觀光局：核定「南庄鄉國際慢城入口意象工程」總計畫經費700萬元(補助款504萬元、配合款126萬元、自償款70萬元)
- 交通部觀光局規定里程碑：
  - 1.108年8月10日提送預算書圖審查。
  - 2.108年9月底前完成工程發包。
  - 3.108年11月底前完成50%計畫進度及請領補助款。
- 108.07.01 交通部觀光局：同意修正計畫書備查。
- 108.07.31 南庄鄉公所：申請因近期才獲准代表會經費墊付，尚未完成委託設計監造上網發包程序，則恐無法依原訂提送預算書圖時間送審，爰申請展延預算書圖審查日期程至108.8.31日(第1次展延)
- 108.08.12 交通部觀光局：同意工程預算書圖送審日期展延至108.8.31
- 108.09.02 南庄鄉公所：因勞務招標尚未決標，申請展延預算書圖審查日期至108.9.30(第2次展延)
- 108.09.09 交通部觀光局：同意預算書圖送審日期第二次展延至108.9.30
- 108.10.25 南庄鄉公所：因委託技術服務2次流標，申請工程預算書審查日至108.11.18(第3次展延)

- 108.10.17 南庄鄉公所：「南庄鄉國際慢城入口意象工程(委託設計、監造)」勞務案決標。
- 108.11.05 交通部觀光局：因委託技術服務2次流標至108.10.17始完成決標，同意預算書圖送審日期第三次展延至108.11.18
- 108.12.05 南庄鄉公所：檢送工程預算書圖至交通部觀光局審辦
- 108.12.10 交通部觀光局：函復工程預算書圖審查意見，並請公所修正後逕依規定辦理工程發包。
- 108.12.24 南庄鄉公所：因工程預算書尚須修正亦已接近交通部觀光局所訂108年底規定期限，故無法於本年度完成上網發包作業，爰此，申請本工程撤案。
- 108.12.30 南庄鄉公所：因無法於108年底完成工程發包，擬申請撤案，申領委託設計服務費補助款。
- 109.01.02 交通部觀光局：同意核撥設計委辦費補助款計新臺幣157,006元整。
- 109.01.03 交通部觀光局：同意撤案事宜，並依實際執行進度申撥規劃設計費用。
- 109.04.17 南庄鄉公所：檢送「南庄鄉國際慢城入口意象工程」規劃設計結案及請款資料
- 109.05.21 交通部觀光局：同意核撥規劃設計費用並結案備查。
